

咸 阳 建 工

# 工 作 简 报

( 2022 年第 03 期 ) ( 总第 3 期 )

咸阳建工党委办公室主编

2022 年 4 月 2 日

## 咸通路综合改造提升项目施工纪实

昼夜奋战！咸通路道路综合改造提升项目将于 3 月底顺利完工。



咸通绿地北起珠泉路，南至滨河西路，全长约 2.67km，改造面积约 60653 m<sup>2</sup>。项目于 2021 年 11 月 03 日正式开工，2022 年 03 月 28 日前完成了人行道、园路、塑胶步道、林下步道等沿线慢行及导视系统的建设任务；增设活动娱乐广

场，升级老旧广场硬化铺装，健身器材、关怀设施等“新装”配套设施；进行林下花海绿化升级改造，设置形象展示区、林下漫步区和自然生态区等景观；新增景观灯，彰显浓厚文化气息，同时对全线遮挡路灯的树木进行适当修剪，提升夜景视觉感，表现植物造型效果，打造亮丽特色景观。预计3月底全部完工。

改造前，咸通绿地苗木老化，设施陈旧，景观效果差，绿地功能弱化，难以满足市民生活需求。主要改造中央绿化带植物梳理、形象展示区设置、林下漫步区和自然生态区打造、照明景观改造、广场园路扩增、升级公厕增量改造等，把咸通路中央绿带建设成为开放式城市新型道路景观带，为市民提供方便、舒适的休憩生活环境。

为提高施工效率，满足工期要求，在施工过程中，咸阳建工投入大量施工管理人员和施工队伍，同时为保证高质量、高效率完成施工任务，抽调多个技术过硬、管理过硬的项目管理人员组建项目部，从气温较低的十一月到气温攀升的三月，各工作班组连续作业。

为保证白天充足的施工作业面，创造有利的施工环境，根据周边环境情况，有条件组织夜间施工，施工人员每天早进场，晚离岗，争取更多的施工作业时间，在做好疫情防控的同时有效衔接工序，极大地提高施工效率和缩短了工期。

在推进施工进度同时加强施工质量管理，在施工技术

和材料选用上下功夫，如针对厂拌热再生沥青混合料和透水彩色沥青混合料与普通沥青混料要求不同，从温度控制、摊铺流程、机械碾压等过程高标准，严要求保证其施工质量。优化材料选用，提高路面结构的防水效果和延展性，有效减少路面积浆等通病。同时严格按照施工验收标准，加强工序，检验批质量检验。

在严格疫情防控的同时，咸阳建工围绕项目关键节点，早谋划、早安排、早部署，组织项目部抢抓施工有效时间，在保证安全和质量的前提下，速度再加快，压足生产任务，如期完成了施工任务。

第一分公司赵雷洋供稿

党委办公室马晓伟审核

## 咸阳建工施工的精品工程

-----咸通绿地休闲空间景观带

**【据咸阳城市绿化管理处报道】**为擦亮咸阳“西部名市、丝路名都”城市名片，提升城市整体绿化环境品质，改善咸通路附近市民生活环境，咸阳市城市管理执法局按照市委市政府的工作要求，以“人民满意”为目标，把咸通路绿地综合改造项目列为“我为群众办实事”实践活动

重点项目之一，按照“四个一流”，严格落实工程管理要求，严控工期，强化工程质量，坚持品质至上，努力建成精品工程。




咸通绿地北起珠泉路，南至滨河西路，全长约 2.67km，改造面积约 60653 m<sup>2</sup>。项目于 2021 年 11 月 3 日正式开工，2022 年 3 月 10 日完成了（珠泉路—渭阳路段）建设任务，（渭阳路—滨河路段）预计 5 月底全部完工。



改造前，咸通绿地苗木老化，设施陈旧，景观效果差，绿地功能弱化，难以满足市民生活需求。主要改造中央绿化带植物梳理、形象展示区设置、林下漫步区和自然生态区打造、照明景观改造、广场园路扩增、升级公厕增量改造等，把咸通路中央绿带建设成为开放式城市新型道路景观带，为市民提供方便、舒适的休憩生活环境。

### **01 亮点：开放共享空间景观带，休闲功能极大提升**

针对原有绿化带封闭较多，仅有几条人行道，园路铺装破损严重，通行舒适性差、安全性差、功能单一等问题，全线重设了人行道、园路、塑胶步道、林下步道等沿线慢行及导视系统，形成开放共享的道路空间景观带，实现市民步行休闲，亲近自然的愿望。

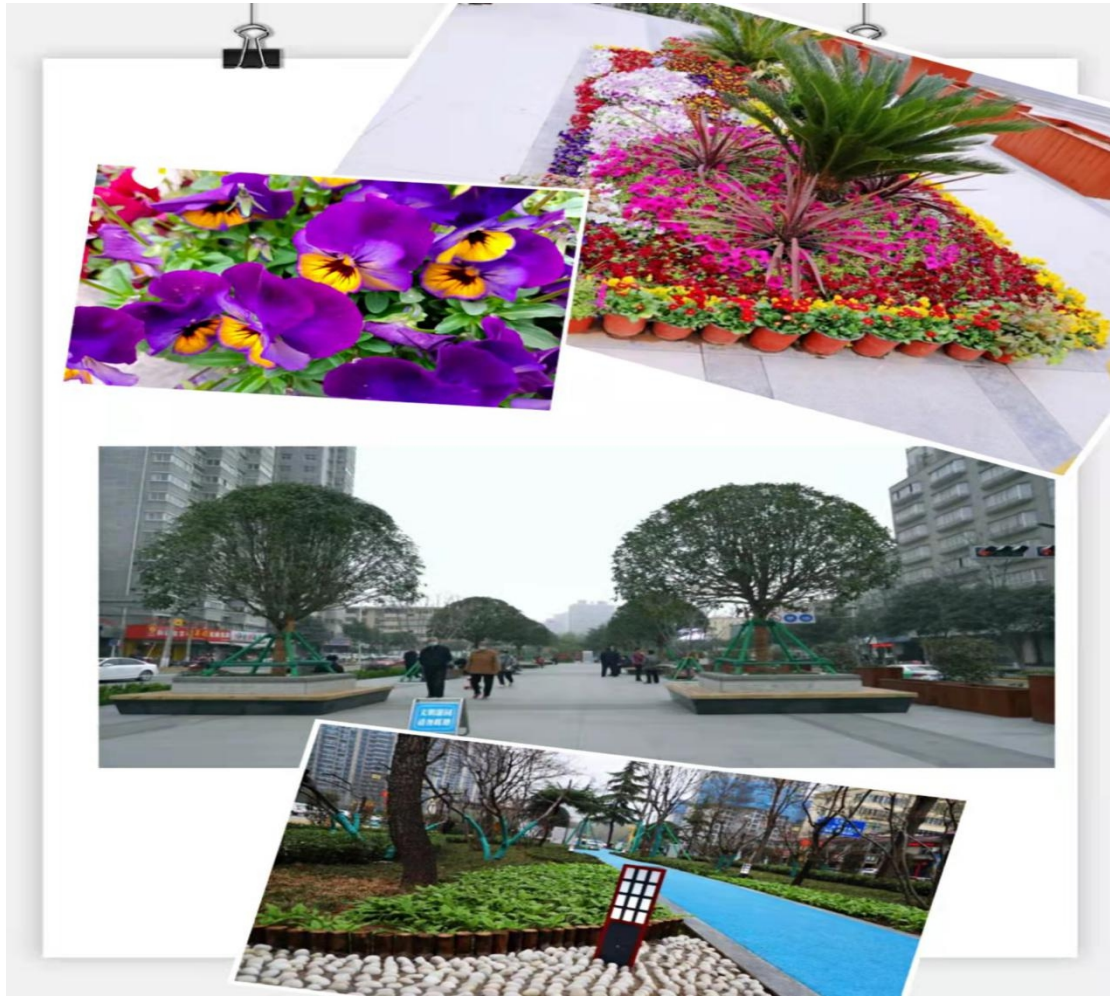

## 02 亮点：扮靓活动娱乐广场，公共区域空间友好舒适

针对沿线缺乏活动娱乐休憩设施，老旧广场特色不鲜明，利用率不高，附近市民活动娱乐空间稀缺等问题，在珠泉路口、玉泉路口、人民路口、渭阳路口、市委对面增设活动娱乐广场，升级老旧广场硬化铺装，休闲座椅、树池围凳、花箱、垃圾桶、健身器材、关怀设施等“新装”配套到位，广场颜值与功能性大幅提升。公厕升级改造，增设1处公共卫生间，提升改造2处老旧公共卫生间。



### 03 亮点：绿带“疏朗通透，季季有景”，景观带独特

针对绿化带林下灌木杂多、凌乱不堪，植物品种搭配不当、树丛厚重、透光不良，树形轮廓感欠缺、花卉地被缺乏、绿化品质不高、缺乏亮点等问题，精心梳理绿化带植物，去除杂乱夹竹桃、花石榴等大灌木，小叶女贞等老化色带植物，保留高大健壮雪松、碧桃等乔木，进行林下花海绿化升级改造，设置形象展示区、林下漫步区和自然生态区等景观。在绿带内增加绣球、玉簪、葱兰、海桐、红叶石楠等开花色叶常绿植物，栽植麦冬等地被植物，在广场树池栽植桂花、樱花等高品质乔木，增花添彩，春天鲜花烂漫、夏天荫凉步道、秋天桂花飘香、冬天绿意盎然，

实现全线空间疏朗通透、季季有景，体现出自然、整洁和生机。



**04 亮点：浇灌、照明设施品质提升，营造特色景观。**

针对原有绿化带浇灌、照明设施缺陷，绿化带内新增快速取水器，随用随取，及时满足植物需水要求。新增景



观灯，彰显浓厚文化气息，同时对全线遮挡路灯的树木进行适当修剪，提升夜景视觉感，表现植物造型效果，打造亮丽特色景观。





### 05 亮点：严格工程建设管理，于细微处见工程质量。

为高标准完成项目建设任务，咸阳市城市绿化管理处抽调专业水平高、责任心强的同志参与项目建设管理，组织管理人员学习大西安城市精品工程，看工艺、学质量。项目管理人员狠抓人员和质量管理，每天徒步巡查工地，掌握建设动态，发现问题及时处理，注重施工细节，严把材料和质量关，每道工序严格要求，一丝不苟。重视后期养护管理，培训养护人员，做到每日擦洗、每日保洁、及时浇灌、专人巡回检查，引导市民文明休闲，爱护绿地设施。
